Stadtquartier Rohrer Höhe
Stuttgart
Leben & Wohnen

Übersichts - Terminplan
für
Gesamtprojekt Planung und Bau

HWP

Nr.	PSP-Code	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger
0	**0**	**1628_ROH_ELW_RTP_3stufig_komp_21-10-2020**	**1436 t**	**Di 03.11.20**	**Mo 27.07.26**	
1	**1**	**Stufe 1**	**440 t**	**Di 03.11.20**	**Mo 01.08.22**	
2	1.1	LPH 1 - Grundlagenermittlung	1 M	Di 03.11.20	Mo 30.11.20	
3	1.2	LPH 2 - Vorplanung	5 M	Di 01.12.20	Mo 26.04.21	2
4	1.3	LPH 3 - Entwurfsplanung	9 M	Mo 15.11.21	Mo 01.08.22	3EA+7 M
5	**2**	**Stufe 2**	**460 t**	**Mo 05.12.22**	**Fr 04.10.24**	
6	2.1	LPH 4 - Genehmigungsplanung	2 M	Mo 05.12.22	Di 31.01.23	
7	2.2	LPH 5 - Ausführungsplanung	9 M	Do 27.07.23	Fr 12.04.24	
8	2.3	LPH 6 - Vorbereitung der Vergabe	6 M	Do 18.01.24	Do 11.07.24	7EA-3 M
9	2.4	LPH 7 - Mitwirkung bei der Vergabe	6 M	Mo 15.04.24	Fr 04.10.24	8EA-3 M
10	**3**	**Stufe 3**	**400 t**	**Mo 16.12.24**	**Mo 27.07.26**	
11	3.1	LPH 8 - Objektüberwachung	18 M	Mo 16.12.24	Fr 29.05.26	
12	3.2	Inbetriebnahme	0 t	Mo 27.07.26	Mo 27.07.26	11EA+2 M

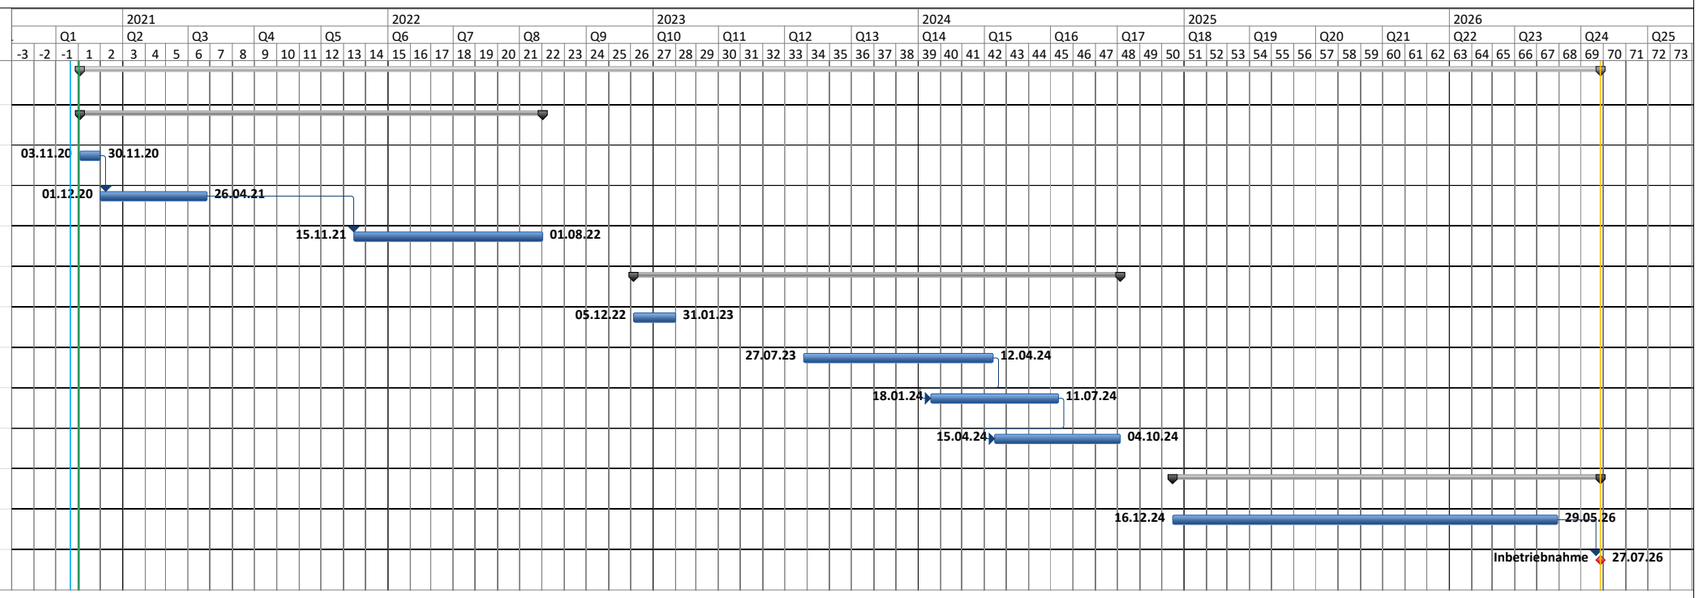

Projekt: ..... 1628_ROH_ELW_RTP_
Statusdatum: 10.10.2020
Autor: ..... Wachholz Frank

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Externer Meilenstein | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Stichtag
Unterbrechung | Sammelvorgang | Externe Vorgänge | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | In Arbeit

© HWP Planungsgesellschaft mbH
