Landeshauptstadt Stuttgart

Männerwohnheim, Friedhofstraße

Rahmenterminplan Entwurf; Grundsatzbeschluss Mai 2014

HBA, 28.04.2014 Wa
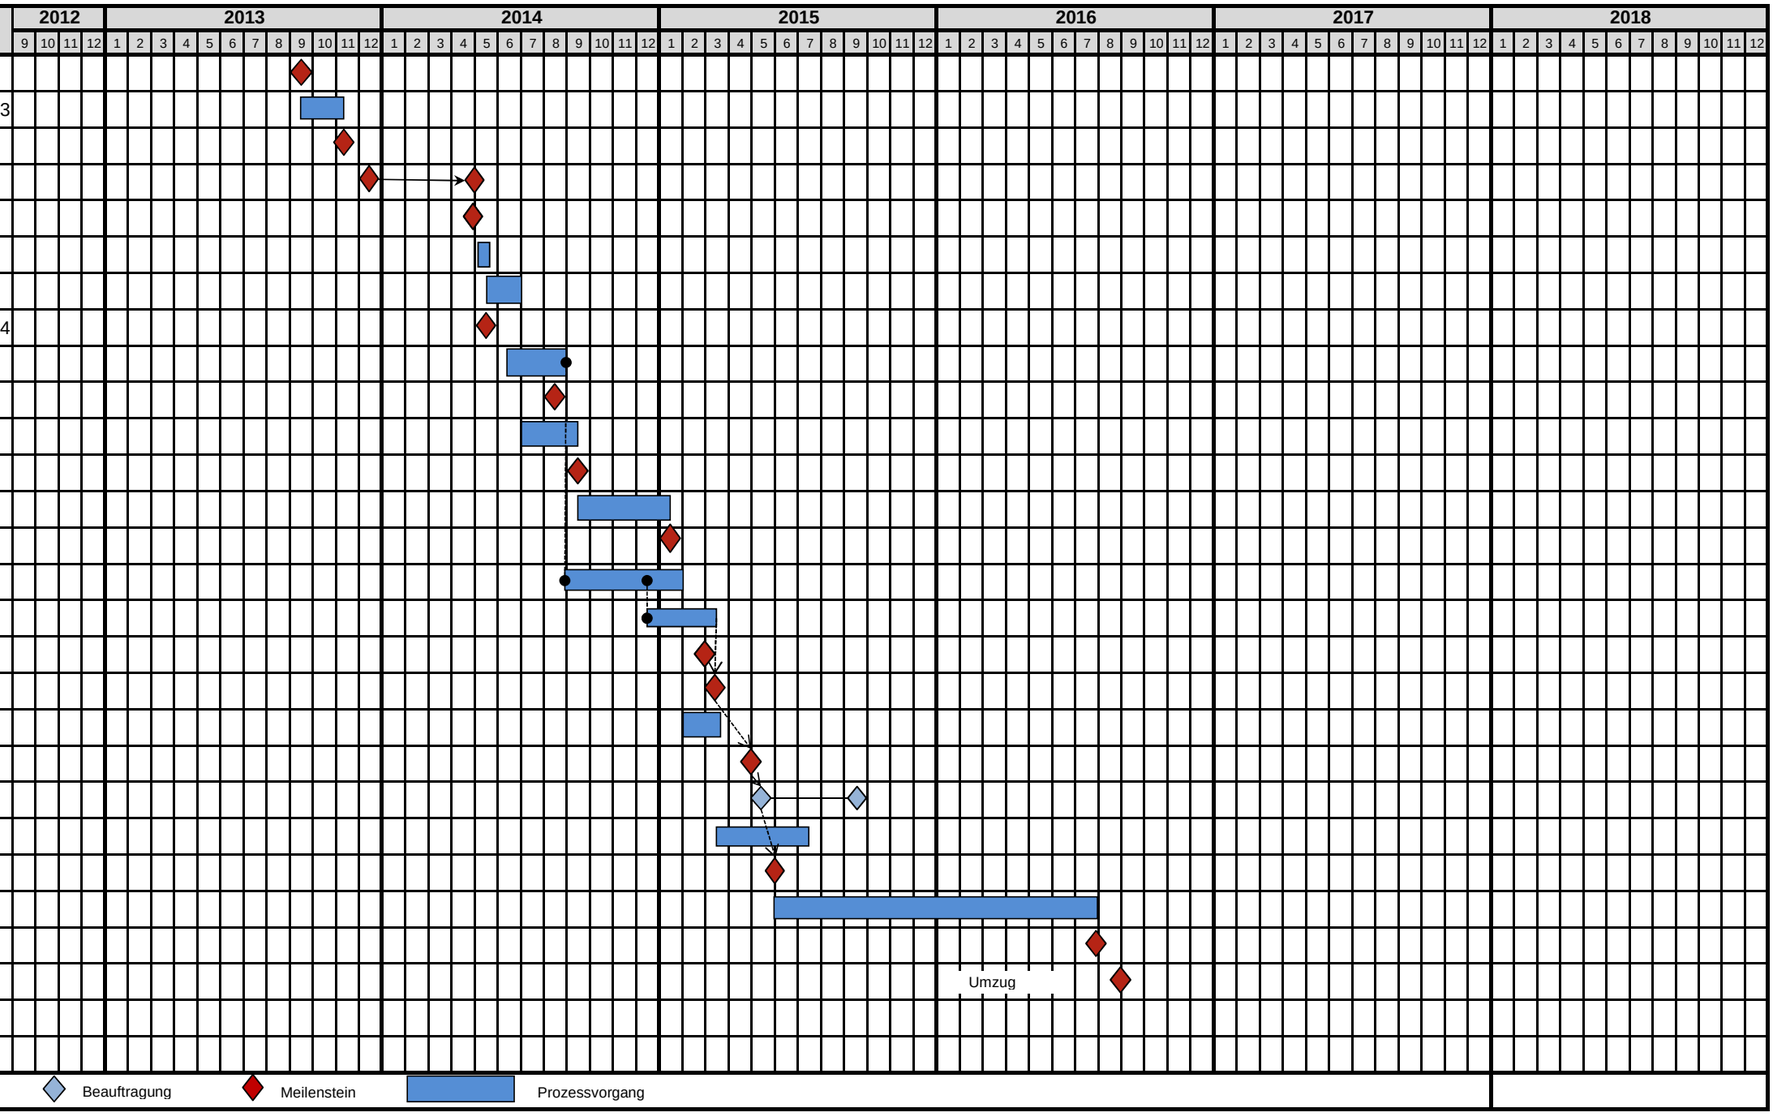
Nr.	VORGANG	von	bis
1	Startgespräch ELW/ HBA	12.09.2013	
2	Prüfung Planerauswahl PS	12.09.2013	05.11.2013
3	Startgespräch ELW, Planer, PS	04.11.2013	
4	Grundsatzbeschluss	Dezember	Mai
5	Raumprogrammfixierung	Mai	
6	Grundlagenermittlung (LPH 1)		
7	Vorentwurf (LPH 2) Grobkostenannahme	Mitte Mai	Ende Juni
8	Variantenentscheidung		16.05.2014
9	Entwurf (LPH 3) Kostenberechnung	2,5 Mon	
10	Einreichung Förderantrag KVJS	Mitte August	
11	Genehmigungsplanung (LPH 4)	2 Mon b Einr.	
12	Einreichung BA		
13	Laufzeit BA		
14	Genehmigung BA		
15	Werkplanung (LPH 5)	5 Mon	
16	Ausschreibung (LPH 6+7 Paket 1)	3 Mon	
17	Bewilligung Fö- Antrag	Mrz 15	
18	Submission Paket 1 > 50%		
19	Vorlagenerstellung	Jan 15	M Febr 15
20	Baubeschluss		
21	Beauftragung Rohbau/ Ausbau/ Technik	Mai 15	
22	Ausschreibung (LPH 6+7 Paket 2)	4 Mon	
23	Baubeginn		
24	Bauausführung (LPH8)	14 Mon	
25	Abnahme		
26	Reinigung/ Inbetriebnahme		
27			
28
