Landeshauptstadt Stuttgart

Männerwohnheim, Friedhofstraße

Rahmenterminplan

Stand 05.11.2013

HBA, 17.10.2013 Wa

Nr.	VORGANG	von	bis
1	Startgespräch KS/ HBA	12.09.2013	
2	Prüfung Planerauswahl PS	12.09.2013	05.11.2013
3	Start off ELW, Planer, PS	04.11.2013	
	Vorprojektbeschluss	Dezember	
	Grundlagenermittlung (LPH 1)		
	Vorentwurf (LPH 2) Grobkostenannahme	03.01.1900	29.11.2013
5	Variantenentscheidung	17.10.2013	
7	Entwurf (LPH 3) Kostenberechnung	3 Mon	
	Förderantrag		
8	Genehmigungsplanung (LPH 4)	2 Mon b Einr.	
9	Einreichung BA		
10	Laufzeit BA		
11	Genehmigung BA		
12	Werkplanung (LPH 5)	6 Mon	
13	Ausschreibung (LPH 6+7 Paket 1)	3 Mon	
14	Submission Paket 1 > 50%		
15	Vorlagenerstellung		
16	Baubeschluss		
17	Beauftragung		
18	Ausschreibung (LPH 6+7 Paket 2)	4 Mon	
19	Baubeginn		
20	Bauausführung (LPH8)	14 Mon	
21	Abnahme		
22	Reinigung/ Inbetriebnahme		
23			
24			
25			

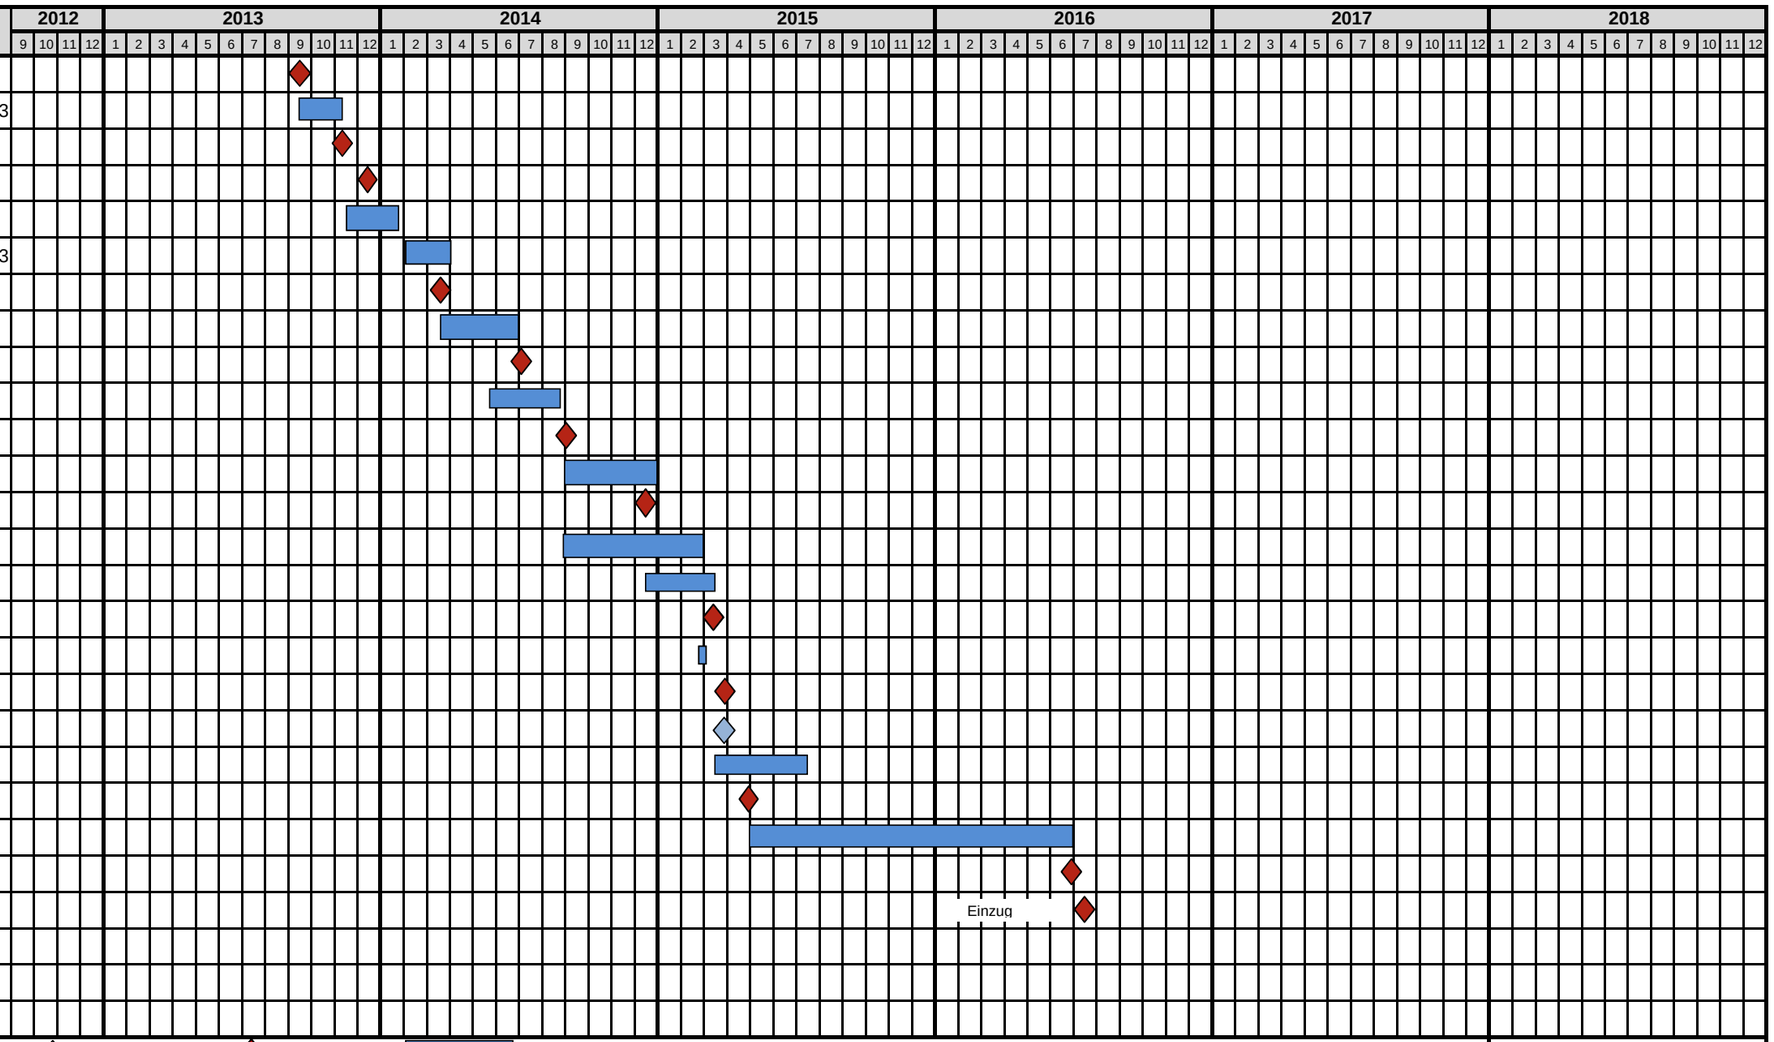

Legende: Beauftragung; Meilenstein; Prozessvorgang
